
 <p><b>CONERGE</b> A Engenharia das NRs</p>		<p><b>LALLEMAND - PIRACICABA-SP</b></p>	
<p><b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b></p>		<p>Relatório 11-0345</p>	<p>Página 1</p>
		<p>Obra 10096</p>	<p>Revisão 0</p>

# INSPEÇÃO CONFORME NORMA REGULAMENTADORA Nº 11

(Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016)



## LALLEMAND



## Talha Elétrica 1T

Este relatório de integridade NR-11 segue os mais rigorosos padrões de qualidade. Os serviços aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho (Profissional Habilitado NR-11).

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.



 <p><b>CONERGE</b> A Engenharia das NRs</p>		<p align="center"><b>LALLEMAND - PIRACICABA-SP</b></p>	
<p align="center"><b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b></p>		<p>Relatório 11-0345</p>	<p>Página 2</p>
		<p>Obra 10096</p>	<p>Revisão 0</p>

### REVISÕES

A - PRELIMINAR	C - PARA CONHECIMENTO	E - PARA CONSTRUÇÃO	G - CONFORME CONSTRUÍDO
B - PARA APROVAÇÃO	D - PARA COTAÇÃO	F - CONFORME COMPRADO	H - CANCELADO
TE - TIPO EMISSÃO			

REV.	TE	DESCRIÇÃO	POR	VER.	APR.	AUT.	DATA
A	B	EMISSÃO INICIAL	GJM	CVA	DSB	CHM	11/06/2024



Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 <p><b>CONERGE</b> A Engenharia das NRs</p>		<b>LALLEMAND - PIRACICABA-SP</b>	
<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b>		Relatório 11-0345	Página 3
		Obra 10096	Revisão 0

## INDICE

1.0 APRESENTAÇÃO .....	4
2.0 ESCOPO DETALHADO .....	4
3.0 OBJETIVO .....	5
4.0 NORMAS DE REFERÊNCIAS .....	5
5.0 SERVIÇO EXECUTADO .....	5
6.0 REQUISITOS LEGAIS .....	6
7.0 TABELA DE DADOS TÉCNICOS .....	6
8.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADE .....	7
9.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES .....	7
10.0 CONCLUSÃO .....	7
10.1 PRÓXIMAS INSPEÇÕES .....	8
11.0 DADOS CONTRATUAIS .....	8
12.0 ANEXOS .....	9
12.1 PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 .....	10
12.2 RELATÓRIO DE CONTROLE DIMENSIONAL.....	11
12.3 TESDE DE CARGA OPERACIONAL.....	12
12.4 CROQUI .....	13
12.5 A.R.T .....	14

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 <p><b>CONERGE</b> A Engenharia das NRs</p>		<b>LALLEMAND - PIRACICABA-SP</b>	
<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b>		Relatório 11-0345	Página 4
		Obra 10096	Revisão 0

## 1.0 APRESENTAÇÃO

Grupo Conerge – Normas Regulamentadoras, possui mais de 24 anos no mercado e com Experiência comprovada no atendimento as exigências das Normas Regulamentadoras, através de Auditorias, Diagnósticos, Inspeções, Laudos, Manutenções, Adequações, Calibração de Instrumentos e Perícias Técnicas.

A Conerge está registrada no CREA e atendendo a determinação do CONFEA/CREA possui corpo técnico e de engenharia profissionais habilitados como responsáveis dos serviços propostos: Engenheiro Mecânico, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Químico, Engenheiro de Segurança, Engenheiro Civil e Arquiteta.

## 2.0 ESCOPO DETALHADO

Acompanhamento fotográfico do serviço realizado;

Análise da documentação existente, pertinentes aos requisitos exigidos pela NR-11;

Inspeção Visual para verificação de corrosão, trincas e desgastes;

Inspeção Visual das estruturas metálicas, parafusos, para corpo, roldanas;

Inspeção dos Trilhos, onde possuir acessos;

Inspeção das Vigas de apoio das talhas;

Inspeção dos ganchos e travas;

Inspeção dimensional das correntes e cabos de aço;

Inspeção Visual no sistema de acionamento e do freio;

Realizar Inspeção Visual das peças de içamento;

Cerificação se os equipamentos de guindar e seus acessórios possuem manutenção preventiva e sua respectiva evidencia;

Verificar as evidências das inspeções periódicas realizadas em cabos de aço, correntes, roldanas e ganchos dos equipamentos de guindar;

Verificar se os itens e subitens obrigatórios da NR-11 estão sendo atendidos;

Verificar se os operadores de equipamentos de guindar estão habilitados;



Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Dr. Manoel Tourinho, n°10, Santos / SP

E-mail: [comercial@conerge-engenharia.com.br](mailto:comercial@conerge-engenharia.com.br)

Tel: (13) 3466-7187

Site: [www.conerge-engenharia.com.br](http://www.conerge-engenharia.com.br)

 <p><b>CONERGE</b> A Engenharia das NRs</p>		<p align="center"><b>LALLEMAND - PIRACICABA-SP</b></p>	
<p align="center"><b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b></p>		<p>Relatório 11-0345</p>	<p>Página 5</p>
		<p>Obra 10096</p>	<p>Revisão 0</p>

### 3.0 OBJETIVO

Verificar os aspectos físicos estruturais, instalações, manutenção, grau de corrosão existente, testes dos funcionamentos dos sistemas de segurança sonoros e luminosos, soldas e documentações do para a liberação do uso do equipamento com segurança, conforme exigência da Portaria MTPS nº 505 da NR-11 de 29 de abril de 2016.



### 4.0 NORMAS DE REFERÊNCIA

- NR-11 – Transporte, movimentação, Armazenagem e Manuzeio de Materiais
- NBR NM 207
- NBR ISO 4309 – Cabo de Aço – Inspeção e Descarte

### 5.0 SERVIÇOS EXECUTADO

A **Talha Elétrica** foi criteriosamente inspecionado e avaliado com relação à conservação da integridade estrutural, a fim de orientar uma execução através de um planejamento das ações a serem tomadas, baseados na norma de referência NR-11. O resultado desta inspeção encontra-se no “Relatório de inspeção” com recomendações e adequações necessárias.

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 <p><b>CONERGE</b> A Engenharia das NRs</p>		<b>LALLEMAND - PIRACICABA-SP</b>	
<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b>		Relatório 11-0345	Página 6
		Obra 10096	Revisão 0



## 6.0 REQUISITOS LEGAIS

Nº	Requisitos Legais	Itens da Norma
1	Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como ascensores, elevadores de carga, guindastes, monta-carga, pontes-rolantes, talhas, empilhadeiras, guinchos, esteiras-rolantes, transportadores de diferentes tipos, serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho.	11.1.3
2	Todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas, ou que apresentem deficiências, deverão ser imediatamente substituídas.	11.1.8

## 7.0 TABELA DE DADOS TÉCNICOS

**ÁREA DE INSTALAÇÃO..... Centrífuga**  
**TIPO DE EQUIPAMENTO..... Talha Elétrica 1T**  
**FABRICANTE..... NADA CONSTA**  
**ANO DE FABRICAÇÃO..... NADA CONSTA**  
**NÚMERO DE SÉRIE..... NADA CONSTA**  
**CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA..... 1 Ton**


Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 <b>CONERGE</b> A Engenharia das NRs	 <b>LALLEMAND</b>	<b>LALLEMAND - PIRACICABA-SP</b>	
		Relatório 11-0345	Página 7
<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b>		Obra 10096	Revisão 0

## 8.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES

TIPO DE PRIORIDADE	CONDIÇÃO DA PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
P0	PRESERVAR A SEGURANÇA A VIDA E EQUIPAMENTOS, COM PLANEJAMENTO IMEDIATO DE INTERVENÇÃO
P1	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
P2	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DA ANOMALIAS
P3	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DA ANOMALIAS, PARA CONSERVAÇÃO ORIGINAL DAS PEÇAS CONSTRUTIVAS

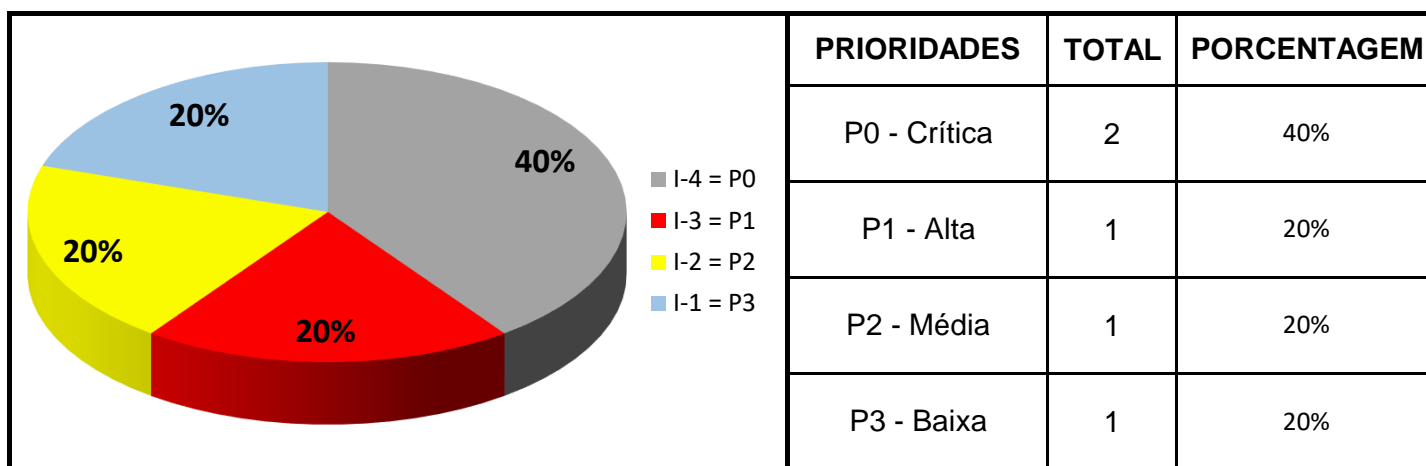

## 9.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES



## 10.0 CONCLUSÃO

Essa vistoria tem validade de 12 meses para o Talha elétrica 1t localizado na LALLEMAND - PIRACICABA/SP, identificados como: Talha elétrica - 1 Ton. Esse equipamento foi inspecionado conforme a NR-11, obtendo resultados satisfatórios, sendo necessário atenderem os prazos estabelecidos e as recomendações citadas em relatório de inspeção NR-11 em anexo (ver anexo 12.1).

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 <p><b>CONERGE</b> A Engenharia das NRs</p>		<b>LALLEMAND - PIRACICABA-SP</b>	
<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b>		Relatório 11-0345	Página 8
		Obra 10096	Revisão 0

## 10.1 PRÓXIMAS INSPEÇÕES

**Próxima Inspeção:** 04/06/2025

## 11.0 DADOS CONTRATUAIS

**Contratante:**..... *Lallemand - SP*

**Responsável/Representante:**..... *Felipe Kerches*

**Equipamento**..... *Talha Elétrica*

**Número da obra:**..... *10096*

**Número do Relatório:**..... *11-0345*

**Início da inspeção:**..... *04/06/2024*

**Término da inspeção:**..... *04/06/2024*

**Data do relatório:**..... *11/06/2024*

**Equipe técnica envolvida:**..... *Ass. Técnico: Guilherme Jannuzzi.*  
*Eng. Responsável: Carlos Henrique de Moraes*

## 12.0 ANEXOS



- 12.1 - Planilha de Inspeção
- 12.2 - Relatório de Controle Dimensional
- 12.3 - Teste de Carga Operacional
- 12.4 - Croqui
- 12.5 - A.R.T

<b>CONTROLE DE EMISSÃO</b>			
<b>Profissional Legalmente Habilitado NR-11</b>	<b>CARLOS HENRIQUE DE MORAES</b>  <b>CREA SP 0640977984</b>	 <b>Assinatura</b>	<b>11/06/2024</b>  <b>Data</b>

*"Inspeção com Segurança e Qualidade é nossa Prioridade"*



Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.



 <p><b>CONERGE</b> A Engenharia das NRs</p>		<p><b>LALLEMAND - PIRACICABA-SP</b></p>	
<p><b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b></p>		<p>Relatório 11-0345</p>	<p>Página 9</p>
		<p>Obra 10096</p>	<p>Revisão 0</p>

# 12.0 - ANEXOS

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

 <b>CONERGE</b> A Engenharia das NRs		<b>LALLEMAND - PIRACICABA-SP</b>	
<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b>		Relatório 11-0345	Página 10
		Obra 10096	Revisão 0

# 12.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.






R. Dr. Manoel Tourinho, nº10, Santos / SP  
 E-mail: [comercial@conerge-engenharia.com.br](mailto:comercial@conerge-engenharia.com.br)  
 Tel: (13) 3466-7187  
 Site: [www.conerge-engenharia.com.br](http://www.conerge-engenharia.com.br)

**24**  
 anos  
 DEUS É FEL

<b>Cliente:</b>	Lallemand	<b>Data:</b>	11/06/2024
<b>Identificação / Tag:</b>	Talha Elétrica 1 Tonelada - Demag	<b>Nº do Relatório:</b>	11-0345
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016.

**LEGENDA DE PRIORIDADE:**





<b>P0 = Crítico</b>
<b>P1 = Prioridade Alta</b>
<b>P2 = Prioridade Média</b>
<b>P3 = Prioridade Baixa</b>



Nº	LOCAL DE INSPEÇÃO	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	EXTERNA	INSPEÇÃO	Foi evidenciado que o equipamento possui identificação de carga máxima em local visível.	NADA CONSTA	-	
2	EXTERNA	INSPEÇÃO	Durante esta inspeção foi verificado que a talha elétrica não possui cálculo estrutural da sustentação do equipamento e de todos os elementos de suportação do seu sistema.	Necessário elaborar o cálculo estrutural de sustentação do equipamento e de todos os elementos de suportação do sistema da talha elétrica com assinatura do Profissional Habilitado e Recolhimento da ART.	P-0	
3	EXTERNA	INSPEÇÃO	Durante a presente inspeção foi evidenciado que o gancho de carga encontra-se com a trava danificada.	Necessário realizar a substituição da trava do gancho de carga, a fim de proporcionar segurança no transporte de cargas e na circulação de pessoas.	P-0	
4	EXTERNA	INSPEÇÃO	Durante a presente inspeção foi evidenciado que o gancho de carga encontra-se com descascamento de tinta.	Necessário realizar o tratamento do gancho de carga a fim de manter sua integridade e evitar processos corrosivos.	P-3	
5	EXTERNA	INSPEÇÃO	Foi evidenciado que o equipamento possui plaqueta.	NADA CONSTA	-	

<b>Ciente:</b>	Lallemand	<b>Data:</b>	11/06/2024
<b>Identificação / Tag:</b>	Talha Elétrica 1 Tonelada - Demag	<b>Nº do Relatório:</b>	11-0345
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTPS n.º 505, de 29 de abril de 2016.

**LEGENDA DE PRIORIDADE:**

<b>P0 = Crítico</b>
<b>P1 = Prioridade Alta</b>
<b>P2 = Prioridade Média</b>
<b>P3 = Prioridade Baixa</b>

Nº	LOCAL DE INSPEÇÃO	TIPO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
6	EXTERNA	INSPEÇÃO	Durante a inspeção foi realizada a avaliação dimensional na corrente do equipamento.	NADA CONSTA	-	
7	EXTERNA	INSPEÇÃO	Durante a presente inspeção, foi evidenciado que na parte superior da proteção contra torção da manga está com fita isolante	Necessário adequar parte superior da proteção contra torção da manga, afim de evitar acidentes e mal funcionamento.	P-2	
8	EXTERNA	INSPEÇÃO	Durante a inspeção foi realizado o teste de carga operacional.	NADA CONSTA		
9	EXTERNA	INSPEÇÃO	Durante a presente inspeção foi evidenciado que a área de movimentação de carga, encontra-se sem sinalização e demarcação	Necessário instalar mecanismos de delimitação e sinalização, nas áreas destinadas a circulação de cargas suspensas, a fim de evitar riscos de esmagamento.	P-1	


 <p><b>CONERGE</b> A Engenharia das NRs</p>		<b>LALLEMAND - PIRACICABA-SP</b>	
<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b>		Relatório 11-0345	Página 11
		Obra 10096	Revisão 0

# 12.2 RELATÓRIO DE CONTROLE DIMENSIONAL

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

<b>CLIENTE:</b>	LALLEMAND	<b>LOCALIZAÇÃO:</b>	PIRACICABA - SP
<b>TAG:</b>	TALHA ELÉTRICA - 1 TON	<b>OBRA:</b>	10096
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TALHA ELÉTRICA	<b>DATA EXECUÇÃO:</b>	04/06/2024

<b>Equipamentos:</b>	<b>Normas e procedimentos aplicáveis:</b>	<b>Material:</b>
PAQ-006	NR-11 Subitem 11.1.3.1	AÇO CARBONO
<b>Especificação:</b>	<b>Desenho de referencia:</b>	<b>Método utilizado:</b>
CORRENTE DE AÇO	NADA CONSTA	MEDIÇÃO POR PAQUÍMETRO
<b>Aplicação da corrente :</b>	<b>Temperatura (° C):</b>	<b>Condição superficial:</b>
IÇAMENTO	25	POLIDO




**RESULTADO**

Foi realizado a medição do diâmetro do elo da corrente através de paquímetro conforme norma NR-11, e as mesmas constam na tabela abaixo.



**LAUDO: APROVADO**

PONTO MEDIDO corrente	Ø nominal (mm)	Ø Mínimo (mm) (Redução em 10%)	Ø Medido (mm)	Redução do Ø em %	PONTO MEDIDO corrente	Ø nominal (mm)	Ø Mínimo (mm) (Redução em 10%)	Ø Medido (mm)	Redução do Ø em %
A	8,00	7,20	7,80	2,5	G	8,00	7,20	7,80	2,5
B	8,00	7,20	7,90	1,3	H	8,00	7,20	8,00	0,0
C	8,00	7,20	8,00	0,0	I	8,00	7,20	8,00	0,0
D	8,00	7,20	8,00	0,0	J	8,00	7,20	8,00	0,0
E	8,00	7,20	7,85	1,9	L	8,00	7,20	8,00	0,0
F	8,00	7,20	8,00	0,0	M	8,00	7,20	7,95	0,6



Locais onde foram coletadas as medidas.

<b>Relatório:</b>	<b>Data do Relatório:</b>	<b>Eng° Responsável:</b> Carlos Henrique de Moraes
11-0345	11/06/2024	Carlos Henrique de Moraes Engenheiro Mecânico CREA-SP 0640977984

 <p><b>CONERGE</b> A Engenharia das NRs</p>		<p><b>LALLEMAND - PIRACICABA-SP</b></p>	
<p><b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b></p>		<p>Relatório 11-0345</p>	<p>Página 12</p>
		<p>Obra 10096</p>	<p>Revisão 0</p>

# 12.3 - TESTE DE CARGA OPERACIONAL

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

<b>CLIENTE:</b>	LALLEMAND DO BRASIL	<b>LOCALIZAÇÃO:</b>	PIRACICABA/SP
<b>TAG:</b>	TALHA ELÉTRICA - 1 TON	<b>OBRA:</b>	10096
<b>DESCRIÇÃO:</b>	TALHA ELÉTRICA	<b>DATA EXECUÇÃO:</b>	04/06/2024

**RESULTADO**

Foi realizado Teste de Carga Operacional na Talha Elétrica

**LAUDO : APROVADO**





**CONCLUSÃO**

No dia 04/06/2024 foi realizado o Teste de Carga Operacional, onde foi levantada a Tampa de um tanque durante cinco minutos obtendo resultados satisfatórios.

**CONTROLE DE EMISSÃO**

n° Rel:	Data do relatório:	Eng° Responsável: Carlos Henrique de Moraes
11-0345	11/06/2024	Carlos Henrique de Moraes Engenheiro Mecânico CREA-SP 0640977984






 <p><b>CONERGE</b> A Engenharia das NRs</p>		<p><b>LALLEMAND - PIRACICABA-SP</b></p>	
<p><b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b></p>		<p>Relatório 11-0345</p>	<p>Página 13</p>
		<p>Obra 10096</p>	<p>Revisão 0</p>

# 12.4 CROQUI

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.
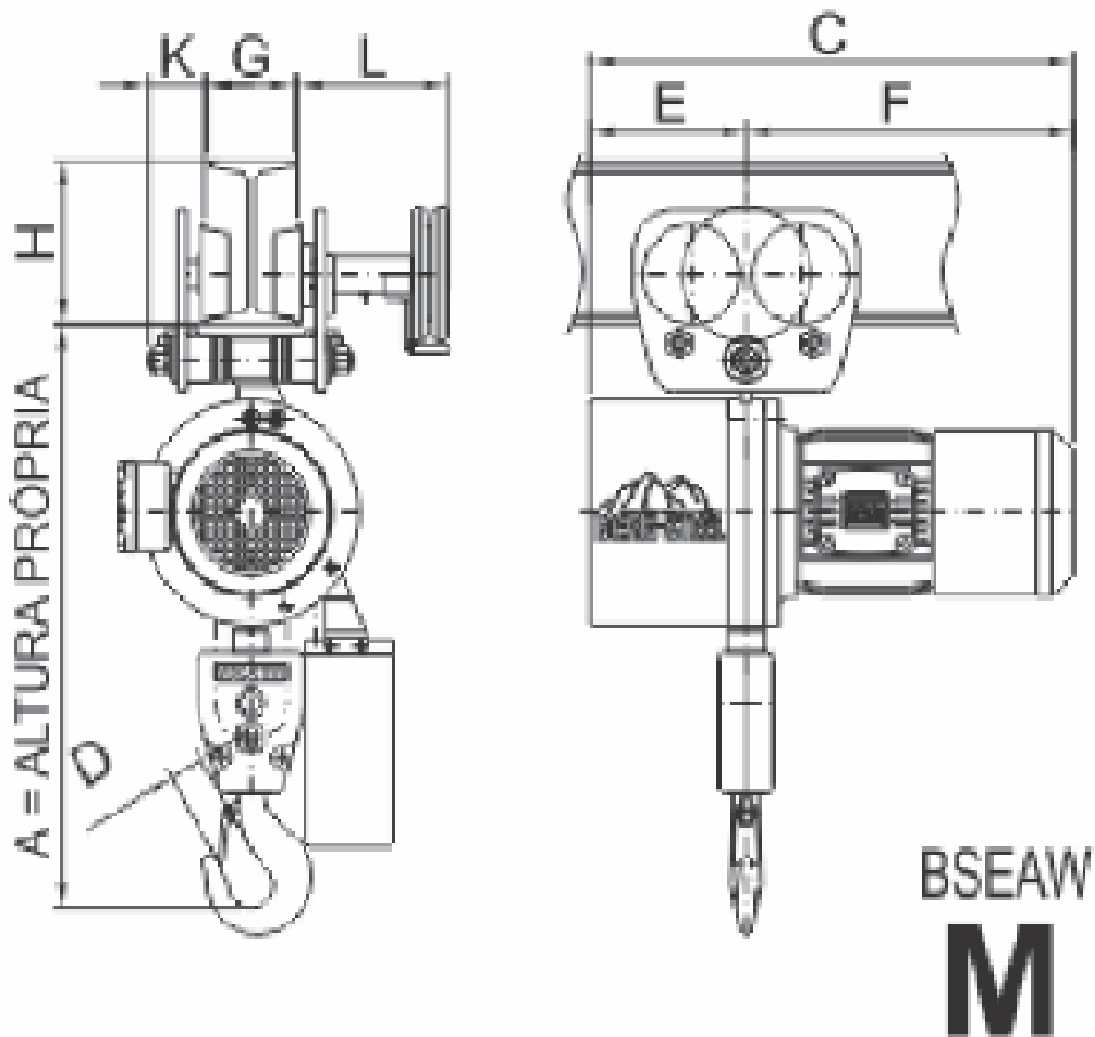
<b>CLIENTE:</b>	LALLEMAND DO BRASIL	<b>LOCALIZAÇÃO:</b>	PIRACICABA/SP
<b>TAG:</b>	TALHA ELÉTRICA - 1T - MONOVIA	<b>OBRA:</b>	10096
<b>Nº DE RELATÓRIO:</b>	11-0345	<b>DATA EXECUÇÃO:</b>	11/06/2024



 <p><b>CONERGE</b> A Engenharia das NRs</p>		<p><b>LALLEMAND - PIRACICABA-SP</b></p>	
<p><b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b></p>		<p>Relatório 11-0345</p>	<p>Página 14</p>
		<p>Obra 10096</p>	<p>Revisão 0</p>

# 12.5 A.R.T

Propriedade Exclusiva do **GRUPO CONERGE – NORMAS REGULAMENTADORAS**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo**

**CREA-SP**

**ART de Obra ou Serviço**  
**2620241031788**

**1. Responsável Técnico**

**CARLOS HENRIQUE DE MORAES**

Título Profissional: **Engenheiro Industrial - Mecânica, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

RNP: **2603421441**

Registro: **0640977984-SP**

Empresa Contratada: **CONERGE CONSULTORIA TREINAMENTOS E VENDAS EIRELI**

Registro: **2317311-SP**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **LALLEMAND SOL. BIOLÓGICAS LTDA**

CPF/CNPJ: **27.268.763/0001-74**

Endereço: **Estrada PROFESSOR MESSIAS JOSÉ BAPTISTA**

Nº: **2007**

Complemento:

Bairro: **ITAPERU**

Cidade: **Piracicaba**

UF: **SP**

CEP: **13432-700**

Contrato: **PR. 5.858/24 / OBRA 10096**

Celebrado em: **26/04/2024**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **1.200,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

**3. Dados da Obra Serviço**

Endereço: **Estrada PROFESSOR MESSIAS JOSÉ BAPTISTA**

Nº: **2007**

Complemento:

Bairro: **ITAPERU**

Cidade: **Piracicaba**

UF: **SP**

CEP: **13432-700**

Data de Início: **04/06/2024**

Previsão de Término: **31/07/2024**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Industrial**

Código:

Proprietário: **LALLEMAND SOL. BIOLÓGICAS LTDA**

CPF/CNPJ: **27.268.763/0001-74**

**4. Atividade Técnica**

			Quantidade	Unidade
<b>Supervisão</b>				
<b>1</b>	<b>Inspeção</b>	<b>de equipamentos mecânicos</b>	<b>21,00000</b>	<b>unidade</b>

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Obra 10096 - LALLEMAND PIRACICABA - NR-11 INSPEÇÃO PERIÓDICA EM EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE IÇAMENTO - TAG's: EMPILHADEIRA A GÁS - CLARK B - LOGÍSTICA, EMPILHADEIRA ELÉTRICA - 2T - LOGÍSTICA, DISPOSITIVO PARA IÇAMENTO DE TAMPÃO - LEITO FLUIDIZADO, DISPOSITIVO PARA IÇAMENTO - TIPO L - FERMENTAÇÃO, CORRENTE DE IÇAMENTO - 3 PERNAS - FERMENTAÇÃO, DISPOSITIVO PARA IÇAMENTO DE BIG BAG - DS, PONTE ROLANTE - 3,2T - FERMENTAÇÃO, PONTE ROLANTE - 5T - LEITO FLUIDIZADO, TALHA CATRACA - 0,75T - NOVA 4 - MANUTENÇÃO, TALHA CATRACA - 0,75T - NOVA 3 - MANUTENÇÃO, TALHA CATRACA - 0,75T - NOVA 2 - MANUTENÇÃO, TALHA CATRACA - 0,75T - NOVA - MANUTENÇÃO, TALHA CATRACA - 0,75T - MANUTENÇÃO, TALHA ELÉTRICA - 1T - MONOVIA - CENTRÍFUGAS, TALHA MANUAL - 1T - MONOVIA NOVA - LEITO FLUIDIZADO, TALHA ELÉTRICA - 2T - MONOVIA - DS, TALHA MANUAL - 1T - MONOVIA - CENTRÍFUGAS, TALHA MANUAL - 2T - MANUTENÇÃO, TALHA MANUAL - 1T - MANUTENÇÃO, TALHA MANUAL - 0,5T - B - MANUTENÇÃO, TALHA MANUAL - 0,5T - A - MANUTENÇÃO.

**6. Declarações**

**Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

## 7. Entidade de Classe

Nenhuma

## 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SANTOS 17 de JULHO de 2024

Local data

CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15

LALLEMAND SOL. BIOLÓGICAS LTDA - CPF/CNPJ: 27.268.763/0001-74

## 9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 99,64

Registrada em: 14/06/2024

Valor Pago R\$ 99,64

Nosso Número: 2620241031788

Versão do sistema

Impresso em: 19/06/2024 16:08:17
